

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 8
з курсу “Управління ІТ-проєктами”


на тему: “Відслідковування виконання проєктів системами управління
проєктами. Управління ризиками. Звіти про стан проєкту. Контроль
проєкту методом освоєного обсягу”

Виконав:
Студент. гр. ФЕП-41 Фіняк Олег
Перевірив:
ас. Стахіра Р.Й.


Хід роботи:

Завдання 1. Супроводження (моніторинг) виконання проекту


1. Збережіть базовий план для побудованого проект, як показано на Рис. 21. Для додавання нових завдань у базовий план після його збереження, необхідно у діалоговому вікні Рис. 21 вибрати базовий план у який будуть додані завдання, а також опцію задати Для обраних завдань. Активні опції із групи Інформація базових планів вказують як буде обновлюватися сумарне завдання під час оновлення базового плану. Встановлення опції У всі підсумкові завдання задає врахування виділених завдань у всіх підсумкових завданнях до яких вони відносяться, а опція Із підлеглих у вибрані підсумкові завдання приводить до того, що виділені завдання зводяться тільки у вибраному підсумковому завданні.
2. Перегляньте інформацію базового плану на діаграмі Ганта із відстеженням (діаграмі Ганта в ProjectLibre) (відрізки базового плану зображені під відрізками поточного плану). Додайте поля базового плану до табличного представлення шляхом вставки стовпчиків (за допомогою контекстного меню) з потрібним іменем (наприклад, Базова тривалість, Базова робота тощо).

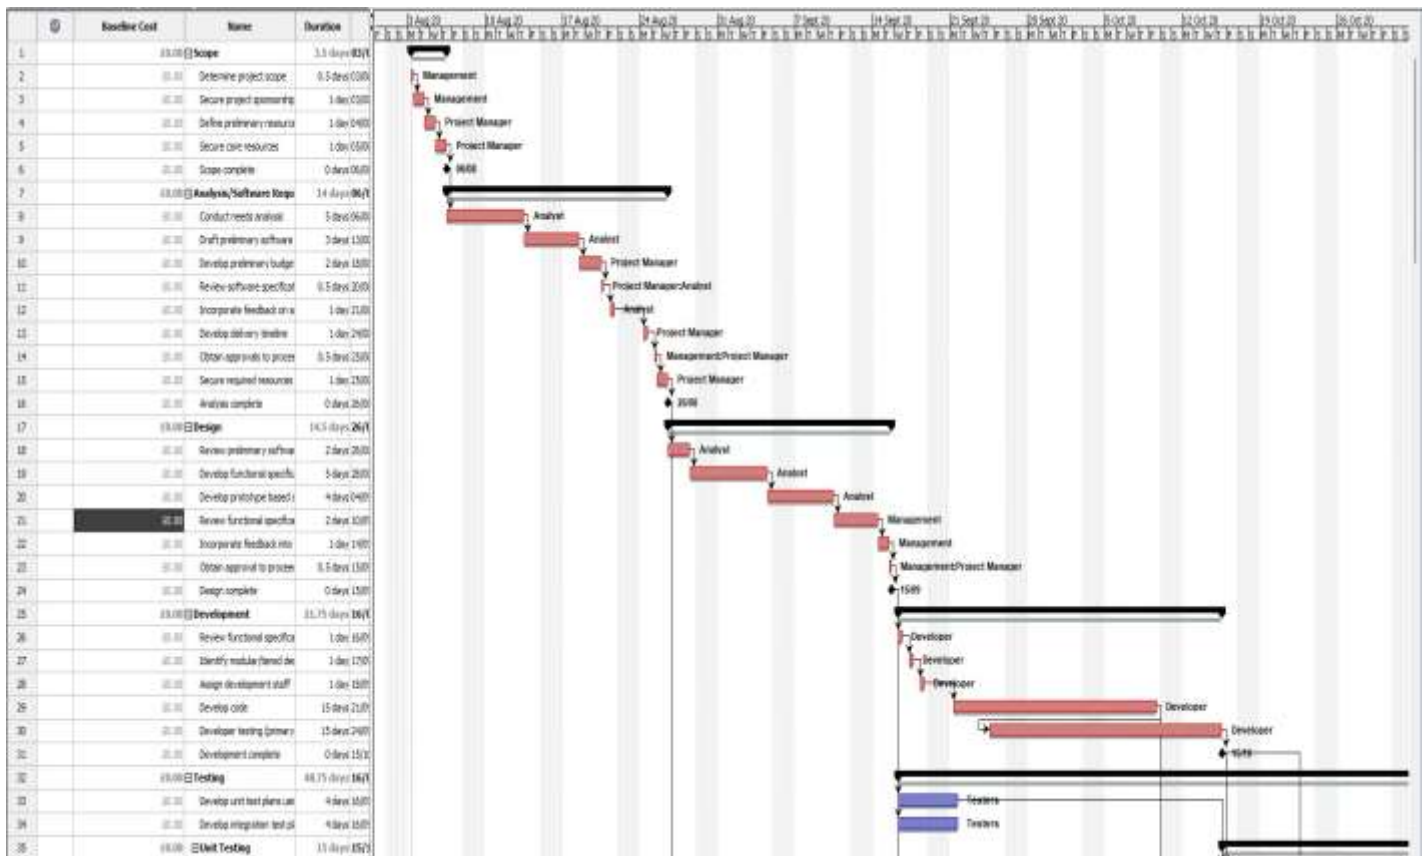

3. Задайте збереження проміжних (interim) планів у діалоговому вікні Рис. 21. У проміжних планах зберігаються тільки дати початку і завершення завдань. Дані щодо дат зберігаються у полях, які налаштовуються, типу Початок 1-10 і Завершення 1-10.

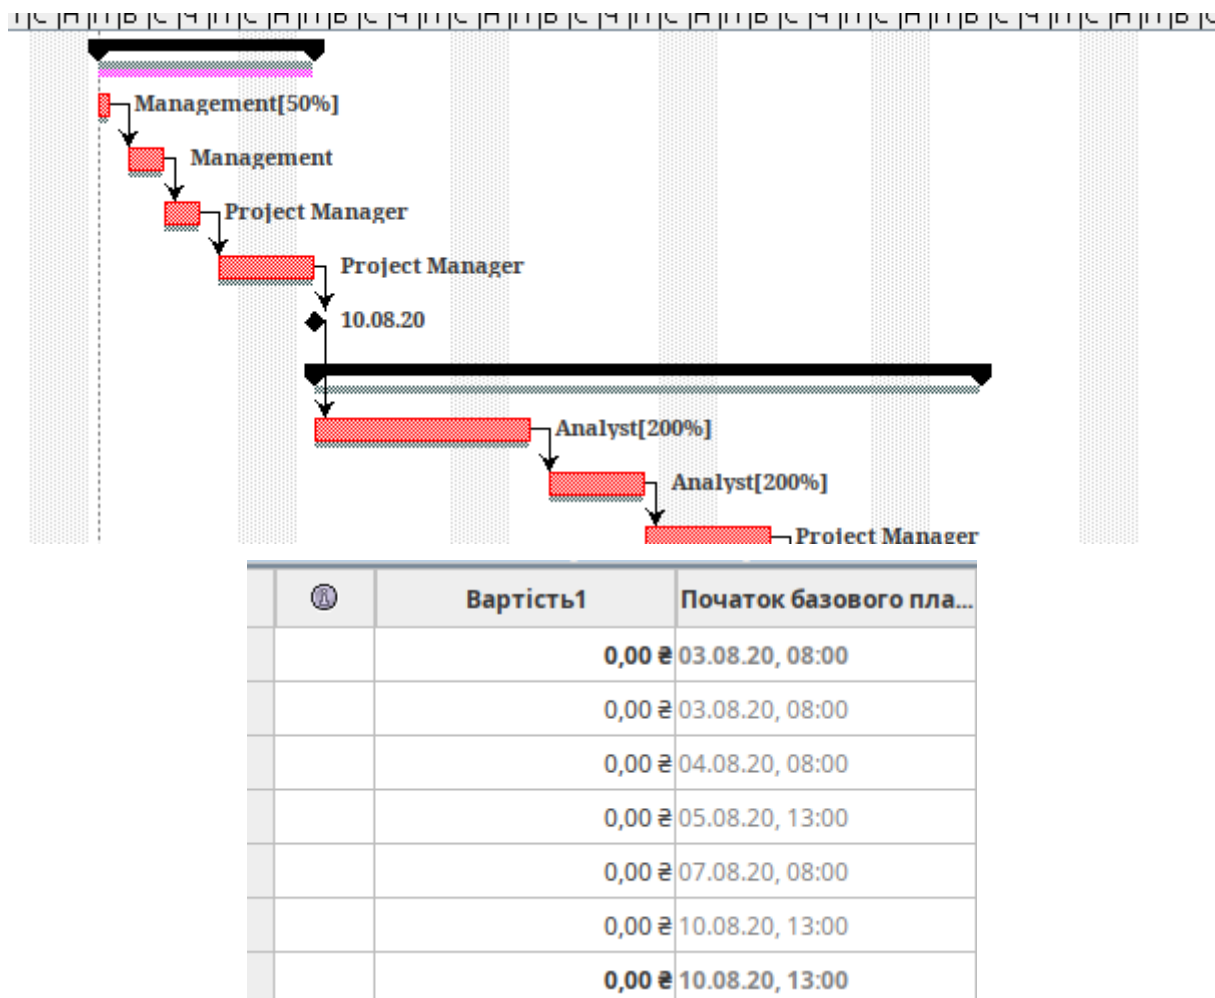

- Проведіть очистку базового або проміжних планів проекту за допомогою меню Очистити базовий план (Clear baseline) через меню Відстеження або відповідну команду в панелі інструментів. Задайте, якщо є потреба очистку плану всього проекту або вибраних завдань.

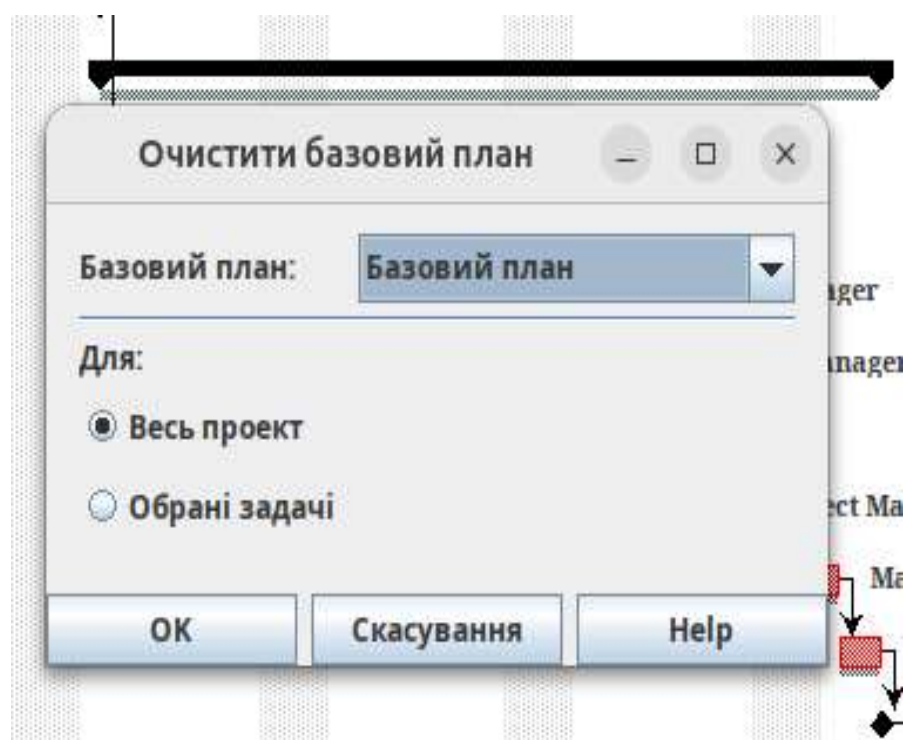


- Реалізуйте відслідковування виконання завдань проекту за допомогою панелі інструментів Відстеження або ж застосовуючи відповідні таблиці (Рис. 22) (для MS Project), або ж виводячи необхідні стовпці в інтерфейс, наприклад, діаграми Ганта в ProjectLibre. Для введення інформації щодо виконання завдань застосовуйте відповідні правила приписування відсотків виконання завдань з лекційного матеріалу.

	% завершення	Назва	Тривалість	
	6%	Scope	3 днів	04.0
	25%	Determine project scop	1 день	04.0
	0%	Define preliminary resc	1,5 днів	04.0
	0%	Secure core resources	1,5 днів	05.0
	0%	Scope complete	0 днів	06.0

- Реалізуйте відслідковування виконання завдань проекту за допомогою інформації щодо роботи ресурсів, використовуючи відповідні інструменти, як показано на Рис. 23, 24, або ж виводячи необхідні стовпці в інтерфейс, наприклад, діаграми Ганта в ProjectLibre

Завдання 2. Звіти і аналіз проекту.

- Організуйте звітність щодо проекту за допомогою меню Звіти. Виведіть звіти різних категорій.
- Проведіть експорт вибраних даних і шаблону проекту у формат електронних таблиць Excel. Організуйте аналіз даних проекту засобами електронних таблиць, зокрема, використайте графічні побудови Excel.

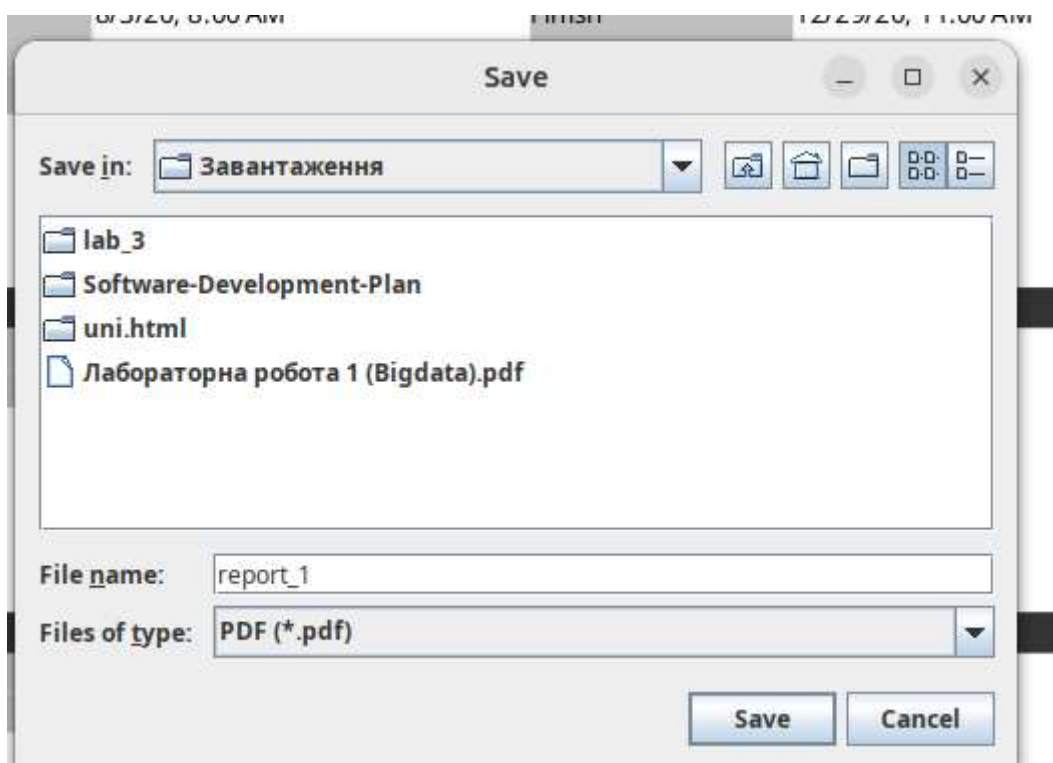

- Проведіть аналіз ходу робіт і затрат методом освоєного обсягу.

		BCWS	BCWP	SV	CV	BAC	VAC	TCPI
1	✓	UAH4004.50	UAH4004.50	UAH0.00	UAH0.00	UAH4004.50	UAH0.00	0
2	✓	UAH404.50	UAH404.50	UAH0.00	UAH0.00	UAH404.50	UAH0.00	0
3	✓	UAH1800.00	UAH1800.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH1800.00	UAH0.00	0
4	✓	UAH1800.00	UAH1800.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH1800.00	UAH0.00	0
5	✓	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	0
6		UAH7604.50	UAH4710.00	-UAH2894.50	UAH0.00	UAH7604.50	UAH2894.50	0
7		UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	0
8		UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	0
9	✓	UAH3000.00	UAH3000.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH3000.00	UAH0.00	0
10		UAH600.00	UAH534.00	-UAH66.00	UAH0.00	UAH600.00	UAH66.00	1
11	✓	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	0
12		UAH1200.00	UAH1176.00	-UAH24.00	UAH0.00	UAH1200.00	UAH24.00	1
13		UAH1004.50	UAH0.00	-UAH1004.50	UAH0.00	UAH1004.50	UAH1004.50	1
14		UAH1800.00	UAH0.00	-UAH1800.00	UAH0.00	UAH1800.00	UAH1800.00	1
15		UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	0
16		UAH6188.00	UAH0.00	-UAH6188.00	UAH0.00	UAH6188.00	UAH6188.00	0
17		UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	0
18		UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	0
19		UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	0
20		UAH3970.00	UAH0.00	-UAH3970.00	UAH0.00	UAH3970.00	UAH3970.00	1
21		UAH1201.00	UAH0.00	-UAH1201.00	UAH0.00	UAH1201.00	UAH1201.00	1
22		UAH1017.00	UAH0.00	-UAH1017.00	UAH0.00	UAH1017.00	UAH1017.00	1
23		UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	0
24		UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	0
25		UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	0
26		UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	0
27		UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	0
28		UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	0
29		UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	0
30		UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	0
31		UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	0
32		UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	0
33		UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	0
34		UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	UAH0.00	0

	VAC	TCPI	CPI	EAC	ACWP	Percent Complete	Name	Duration
1	UAH0.00	0.0	0.0	UAH4004.50	UAH4004.50	100%	☐ Scope	3 days 8/4/20
2	UAH0.00	0.0	1.0	UAH404.50	UAH404.50	100%	Determine project scope	1 day 8/4/20
3	UAH0.00	0.0	1.0	UAH1800.00	UAH1800.00	100%	Define preliminary resources	1.5 days 8/4/20
4	UAH0.00	0.0	1.0	UAH1800.00	UAH1800.00	100%	Secure core resources	1.5 days 8/5/20
5	UAH0.00	0.0	0.0	UAH0.00	UAH0.00	100%	Scope complete	0 days 8/7/20
6	UAH2894.50	0.0	0.0	UAH4800.00	UAH4710.00	79%	☐ Analysis/Software Requirements	16.5 days 8/7/20
7	UAH0.00	0.0	0.0	UAH0.00	UAH0.00	98%	Conduct needs analysis	5.5 days 8/7/20
8	UAH0.00	0.0	0.0	UAH0.00	UAH0.00	98%	Draft preliminary software	3.5 days 8/14/20
9	UAH0.00	0.0	1.0	UAH3000.00	UAH3000.00	100%	Develop preliminary business	2.5 days 8/20/20
10	UAH0.00	1.0	1.0	UAH600.00	UAH534.00	89%	Review software specification	0.5 days 8/24/20
11	UAH0.00	0.0	0.0	UAH0.00	UAH0.00	100%	Incorporate feedback comments	1 day 8/25/20
12	UAH0.00	1.0	1.0	UAH1200.00	UAH1176.00	98%	Develop delivery timeline	1 day 8/26/20
13	UAH1004.50	1.0	0.0	UAH0.00	UAH0.00	0%	Obtain approvals to proceed	1 day 8/27/20
14	UAH1800.00	1.0	0.0	UAH0.00	UAH0.00	0%	Secure required resources	1.5 days 8/28/20
15	UAH0.00	0.0	0.0	UAH0.00	UAH0.00	0%	Analysis complete	0 days 8/31/20
16	UAH6188.00	0.0	0.0	UAH0.00	UAH0.00	0%	☐ Design	17 days 8/31/20
17	UAH0.00	0.0	0.0	UAH0.00	UAH0.00	0%	Review preliminary software	2.5 days 8/31/20
18	UAH0.00	0.0	0.0	UAH0.00	UAH0.00	0%	Develop functional specification	5.5 days 9/3/20
19	UAH0.00	0.0	0.0	UAH0.00	UAH0.00	0%	Develop prototype based on	4.5 days 9/10/20
20	UAH3970.00	1.0	0.0	UAH0.00	UAH0.00	0%	Review functional specification	2.5 days 9/17/20
21	UAH1201.00	1.0	0.0	UAH0.00	UAH0.00	0%	Incorporate feedback comments	1.5 days 9/21/20
22	UAH1017.00	1.0	0.0	UAH0.00	UAH0.00	0%	Obtain approval to proceed	0.5 days 9/23/20
23	UAH0.00	0.0	0.0	UAH0.00	UAH0.00	0%	Design complete	0 days 9/23/20
24	UAH0.00	0.0	0.0	UAH0.00	UAH0.00	0%	☐ Development	22 days 9/23/20
25	UAH0.00	0.0	0.0	UAH0.00	UAH0.00	0%	Review functional specification	1 day 9/23/20
26	UAH0.00	0.0	0.0	UAH0.00	UAH0.00	0%	Identify modular/tiered	1 day 9/24/20
27	UAH0.00	0.0	0.0	UAH0.00	UAH0.00	0%	Assign development staff	1 day 9/25/20
28	UAH0.00	0.0	0.0	UAH0.00	UAH0.00	0%	Develop code	15 days 9/28/20
29	UAH0.00	0.0	0.0	UAH0.00	UAH0.00	0%	Developer testing (print)	15.25 days 10/2/20
30	UAH0.00	0.0	0.0	UAH0.00	UAH0.00	0%	Development complete	0 days 10/23/20
31	UAH0.00	0.0	0.0	UAH0.00	UAH0.00	0%	☐ Testing	51.125 days 9/23/20
32	UAH0.00	0.0	0.0	UAH0.00	UAH0.00	0%	Develop unit test plans	4 days 9/23/20
33	UAH0.00	0.0	0.0	UAH0.00	UAH0.00	0%	Develop integration test	4 days 9/23/20
34	UAH0.00	0.0	0.0	UAH0.00	UAH0.00	0%	☐ Unit Testing	16.125 days 10/2/20

Висновок: під час виконання даної лабораторної роботи, я попрацювала із оптимізацією розкладу проекту за ресурсами, часом і вартістю.

