

#### Лабораторна робота №4

Структуризація у проектах, побудова діаграми Ганта та мережевого графіка.

Побудова структури бізнес процесів із використанням технологій IDEF.

Для створення розкладу робіт у програмі управління проектами необхідно внести завдання у діаграму Ганта відповідно до їх ієрархії. Існують декілька методик внесення завдань у діаграму Ганта:

- Довільний ввід – завдання заносять без збереження їх послідовності або групування. Потрібні зміни вносять пізніше;
- Послідовний ввід – завдання вносять послідовно, від початку до завершення проекту (або навпаки);
- Позначення фаз – вносять тільки основні завдання. У подальшому їх декомпонують;
- Позначення віх – вносять ключові завдання. Далі у розклад вносять завдання необхідні для виконання раніше внесених завдань.

Для внесення завдання використовують табличну частину діаграми Ганта, крім того завдання можна редагувати за допомогою подвійного клацання у відповідному рядку діаграми.

Для розміщення завдань у логічній послідовності може застосовуватися переміщення, доповнення, копіювання і видалення завдань. Переміщення завдання за допомогою миші можливе після його виділення, додавання нового завдання над виділеним реалізує меню Вставка – Нове завдання, копіювання і видалення завдання такі ж, як і у інших прикладних програм.

Після розміщення завдань у логічній послідовності необхідно створити структуру, яка буде представляти ієрархію виконуваних завдань. Завдання найвищого рівня представляється як Підсумкове завдання, завдання нижчого рівня є підзавданнями. Кожне таке завдання у свою чергу може бути також поділене на підзавдання. Переміщення завдань на рівень вище або нижче можуть реалізовуватися у різних програмах по-різному, як правило, для цього після вибору завдання або ж групи завдань використовуються команди Outdent (Підвищити рівень) або Indent (Понизити рівень) за допомогою відповідних панелей інструментів, або ж за допомогою контекстного меню завдання. Окрім, зміни лівого відступу перед завданням у табличній частині, одночасно змінюється графічне представлення робіт з виділенням за допомогою спеціальної дуги завдань вищого рівня.

Кожен рівень і елемент структурної декомпозиції робіт описується за допомогою унікального коду, який вказує на рівень в структурній ієрархії. Програмами за замовчуванням створюються коди структурної декомпозиції робіт на основі структурних номерів. За замовчуванням у таблиці наведено мінімально необхідну кількість інформації (стовпчиків) щодо завдань проекту. У випадку необхідності відображення/приховування стовпців скористайтесь контекстним меню заголовків стовпців табличної частини Додати/Сховати колонку (Insert/Hide column) або опцією Представлення різних таблиць для MS Project (в останньому випадку в інтерфейс виводиться відповідний набір інформації представлений набором колонок).

Крім того, у деяких програмах можна налаштувати власну схему структурної декомпозиції робіт. Окрім кодів, структурна декомпозиція може бути представлена графічно у вигляді діаграми WBS (work breakdown structure).

### **Завдання. Побудова розкладу проекту.**

Хід виконання завдання.

1. Перейдіть у режим перегляду діаграми Ганта (меню Вид – Діаграма Ганта) і внесіть завдання проекту (Навчальний план) у її табличну частину, можливо за допомогою довільного порядку введення.
2. Як варіант, для завдань, які повторюються періодично, можна задати їх повторюваність за допомогою меню – Повторювана задача (Recurring task) (MS Project). У діалоговому вікні задайте параметри такої задачі, зокрема, частоту і діапазон повторення. Повторюване завдання відображається у вигляді Підсумкового завдання із представленням його повторень у вигляді окремих підзавдань.
3. Перегляньте введені завдання і, якщо є потреба, розмістіть їх у логічній послідовності.
4. Проведіть структурування завдань за допомогою відповідної панелі інструментів.
5. Задайте відображення структурних номерів на діаграмі Ганта, вибираючи у контекстному меню заголовку табличної частини діаграми вставку стовпчика WBS (Рис. 4).

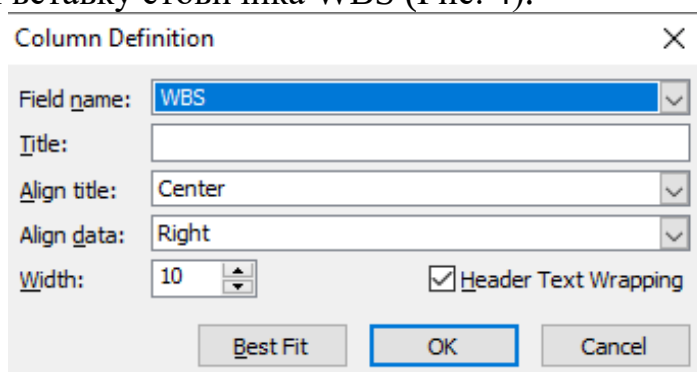


Рис. 4. Діалогове вікно вставки стовпчика у табличній частині діаграми Ганта.

6. Налаштуйте власну схему структурної декомпозиції робіт (WBS) за допомогою меню WBS – Define code (MS Project). У діалоговому вікні виберіть префікс коду проекту, маску коду проекту, довжину користувацького коду і розділювач (Рис. 5). Залиште ввімкненими опції створення коду для нових завдань і перевірку унікальності нових кодів СДР. Для відображення кодів у діаграму Ганта вставте стовпчик із заголовком WBS.

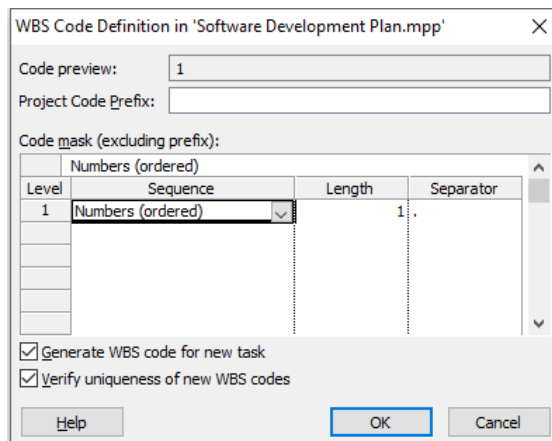


Рис. 5. Діалогове вікно налаштування користувацької схеми WBS.

7. Задайте відображення WBS за допомогою панелі інструментів або меню Вид в ProjectLibre.
8. Інформацію про номер завдання у структурі WBS можна отримати на вкладці Advanced з меню Інформація про завдання.
9. Проведіть імпорт даних щодо проекту, які містять інформацію щодо завдань із програм електронних таблиць. Для цього сформууйте структуру електронної таблиці таким чином, щоб вона відповідала набору полів діаграми Ганта. Після заповнення і збереження файлу електронної таблиці її необхідно відкрити в проектувальнику.
